

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली,
२०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण

स्वतः प्रकाशन

२०८२ माघ - २०८२ चैत्र मसान्तसम्म

नेपाल सरकार

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ

सानोठिमी, भक्तपुर

नेपालको संविधानले नागरिकहरूमा सूचनाको हक प्रत्याभूत गरेको छ । सूचनाको हकको कार्यान्वयनको लागि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम प्रत्येक सार्वजनिक निकायले आफ्ना गतिविधिहरूको विवरण ३/३ महिनामा प्रकाशित गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

यस केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले चालु आ.व. २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमासिक माघ देखि चैत्र मसान्तसम्म गरेका प्रमुख कार्यहरूको विवरण सबै सरोकारीतहरूको लागि स्वतः प्रकाशन गरिएको छ ।

मिति: २०८२/१२/३०

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ
सानोठिमी, भक्तपुर ।

नेपाल सरकार
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली,
२०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण
स्वतः प्रकाशन
अवधि: २०८२ माघ देखि २०८२ चैत्र मसान्तसम्म

१. परिचय

वि.स. २०७२ साल बैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पहरूका कारणले क्षतिग्रस्त भएका सामुदायिक विद्यालयहरूको पुनर्निर्माण कार्यलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने अभिप्रायले वि.स. २०७२ फाल्गुण १७ गते शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ स्थापना भएको थियो । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि सरकारका विभिन्न तहको संगठनात्मक संरचनामा समायोजन गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पनि संगठनात्मक संरचनामा परिवर्तन गरी भइरहेको पुनर्निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा थप तिब्रता दिन केन्द्रीय र जिल्लास्तरीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइहरू प्राधिकरण मातहत रहने गरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, निर्देशक समितिको २०७४ चैत्र २० को १२ औं बैठकले निर्णय गरे पश्चात यस इकाइ प्राधिकरणको मातहतमा रही आफ्ना कार्यहरूलाई अगाडी बढाई रहेकोमा वि.स. २०७८ पौष १० मा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अवधि समाप्त हुने भएकोले समितिको २०७८ भाद्र १२ को निर्णयानुसार २०७८ आश्विन १ देखि केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइको बाँकी काम, सम्पत्ति र दायित्व समेत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा हस्तान्तरण भई हाल इकाइ मन्त्रालय मातहतको विभागीय कार्यालयको रूपमा संचालनमा रहेको छ ।

वि.स. २०७२ को भूकम्पबाट क्षतिपुगेका ७६७७ वटा सामुदायिक विद्यालयहरू मध्ये हालसम्म ७६७७ निर्माण सम्पन्न भैसकेका र पछिल्ला ५ वटा विद्यालय हस्तान्तरणको अवस्थामा रहेका छन्। पुनर्निर्माण कार्य अन्तर्गत ३४५९ वटा शौचालय र २१७० वटा खानेपानीको निर्माणको कार्य सम्पन्न भै सकेका छन् । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त त्रिविविका ३९ वटा आङ्गिक क्याम्पसको निर्माणको कार्यको डिपिआर तयार भएतापनि स्रोत प्राप्तिको सुनिश्चितता नभए कारणले अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था छ ।

वि.स. २०७२ को गोरखा भूकम्पको अनुभवबाट पाठ सिक्दै पुनर्निर्माण गर्दा Build Back Better को विश्वव्यापी अवधारणालाई आत्मसाथ गरी विद्यालय भवन एवम् भौतिक पूर्वाधारहरू बालमैत्री, वातावरण मैत्री, लैंगिक मैत्री र विपद् प्रतिरोधी निर्माण गरिएको छ । वि.स. २०७२ को गोरखा भूकम्पको क्षति पुगेका विद्यालयको पुनर्निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा रहेकोमा नेपाल सरकार, मन्त्रपरिषद्को २०८० माघ २५ को निर्णयानुसार वि. स. २०८० को जाजरकोट तथा बझाङ भूकम्पबाट क्षति पुगेका सामुदायिक विद्यालयको

पुनर्निर्माणको लागि १५ वटा जिल्लामा आयोजनाको कार्य क्षेत्र विस्तार भएको छ साथै नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको २०८२ बैशाख २५ को निर्णय अनुसार भूकम्प, बाढी पहिरो लगायत प्राकृतिक विपद् तथा सालबसाली विनियोजन भएका कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि आयोजनाको कार्यक्षेत्र देशभरनै विस्तार भएको ।

अधिक विद्यार्थी (हाल दुई हजार भन्दा वढी विद्यार्थी) भएका विद्यालयको थप भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ८९ वटा विद्यालय छनोट भइ २७ वटामा निर्माण कार्य शुरू भैसकेको र थप विद्यालयमा निर्माण कार्य शुरू हुने चरणमा रहेको छ ।

२०७२ को भूकम्पबाट क्षति पुगेका विद्यालय पुनर्निर्माणको बाँकी वचत रकमबाट जाजरकोट भूकम्पबाट क्षति पुगेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका विद्यालयको पुनर्निर्माण गर्न सहमति प्राप्त भए अनुसार एडिबी मार्फत हाल जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका २९ वटा विद्यालय पुनर्निर्माण, जाइका मार्फत जाजरकोटमा ११ वटा विद्यालय पुनर्निर्माणको कार्य भैरहेको छ। यसै गरी जिपिई/युनिसेफको सहयोगमा बझाङ जिल्लामा ९ वटा विद्यालयमा पक्की भवन तथा जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका ९० वटा अर्धपक्की कक्षाकोठा पुनर्निर्माणको कार्य भैरहेको छ । गत आवमा जाजरकोट तथा बझाङ भूकम्पबाट क्षति पुगेका विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समिति मार्फत १४४ वटा कक्षाकोठा पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएका छन्। चालु आ.व. मा थप १३४ वटा कक्षा कोठा पुनर्निर्माण भैरहेका छन् ।

२. विद्यालय पुनर्निर्माण कार्यको अवस्था:

क. २०७२ को भूकम्पबाट क्षति पुगेका विद्यालयको पुनर्निर्माण कार्यको हाल सम्मको प्रगति:

क्र.स.	विवरण	निर्माण सम्पन्न	निर्माणाधिन	जम्मा	कैफियत
१.	वि.व्य. स. मार्फत	६०१०	०	६०१०	
२.	निर्माण व्यवसायी मार्फत	८७४	०	८७४	
३.	गैर सरकारी संघ संस्था मार्फत	७९३	०	७९३	
	जम्मा	७६७७	०	७६७७	
४.	शौचालय	३४५९	०	३४५९	
५.	खानेपानी	२१७०	०	२१७०	

* ५ वटा विद्यालय हस्तान्तरण हुने अन्तिम चरणमा रहेका ।

* भारतीय सरकारको अनुदान सहयोगमा थप १४ वटा विद्यालय पुनर्निर्माण हुने क्रममा रहेका ।

* एक्जिम बैंक स्रोत प्रयोगमा समस्याको कारण त्रिविविका ३९ वटा क्याम्पस पुनर्निर्माण कार्य शुरू हुन नसकेको ।

ख. २०८० को पश्चिम नेपाल भूकम्पले क्षति पुर्याएका विद्यालयको पुनर्निर्माणको अवस्था: आव २०८१/८२

जिल्ला	एडिवि मार्फत	जाइका मार्फत	जिपिइ मार्फत	वि व्य स मार्फत	कैफियत
जाजरकोट	१८	११	५० अर्ध पक्की	चारकोठे ८, दुईकोठे २३	
बझाङ	०	०	९	चारकोठे ४, दुईकोठे ९	
रुकुम पश्चिम	११	०	४० अर्ध पक्की	चारकोठे २, दुईकोठे १२	
जम्मा	२९	११		चारकोठे १४ वटा र दुईकोठे ४४ वटा विद्यालय	

३. सम्बत् २०८० को पश्चिम नेपाल भूकम्पबाट क्षति पुगी पुनर्निर्माण कार्य भैरहेका विद्यालय विवरण:

क. एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा पुनर्निर्माण भैरहेका विद्यालयहरू:

क्र.सं.	विद्यालयको नाम	जिल्ला	स्थानीय तह	वडा नं.	स्थान
१	श्री सरस्वती माध्यमिक विद्यालय	जाजरकोट	शिवालय गाउँपालिका	३	सिमा
२	श्री चन्द्र दिपक माध्यमिक विद्यालय	जाजरकोट	शिवालय गाउँपालिका	९	कदाबन्जडे टोल
३	श्री वीरेन्द्र माध्यमिक विद्यालय	जाजरकोट	शिवालय गाउँपालिका	७	जुङ्गाथापा चौर
४	श्री इन्द्रज्योति माध्यमिक विद्यालय	जाजरकोट	शिवालय गाउँपालिका	६	थलाराइकर
५	श्री सरस्वती माध्यमिक विद्यालय	जाजरकोट	शिवालय गाउँपालिका	४	तलगुहेला
६	जन विकास माध्यमिक विद्यालय	जाजरकोट	छेडागाड नगरपालिका	६	सुवनाउली
७	लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय	जाजरकोट	छेडागाड नगरपालिका	२	अन्दरकोट
८	रामोदय माध्यमिक विद्यालय	जाजरकोट	छेडागाड नगरपालिका	४	जेवा
९	नारायणी माध्यमिक विद्यालय	जाजरकोट	छेडागाड नगरपालिका	१२	काकीगाउँ
१०	श्री बालकल्याण माध्यमिक विद्यालय	रुकुम पश्चिम	आठबीसकोट नगरपालिका	९	राडि
११	श्री नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय	रुकुम पश्चिम	आठबीसकोट नगरपालिका	१२	गत्तासैना
१२	श्री जनकल्याण माध्यमिक विद्यालय	रुकुम पश्चिम	मुसिकोट नगरपालिका	१२	काश पोखरी

१३	श्री सितल माध्यमिक विद्यालय	रुकुम पश्चिम	सानीभेरी गाउँपालिका	१	पकैया
१४	सानीभेरी माध्यमिक विद्यालय	रुकुम पश्चिम	सानीभेरी गाउँपालिका	४	मेघा बालिबाड
१५	श्री आदर्श माध्यमिक विद्यालय	रुकुम पश्चिम	आठबीसकोट नगरपालिका	१४	बाँखे जमिरकोट
१६	सूर्योदय माध्यमिक विद्यालय	रुकुम पश्चिम	आठबीसकोट नगरपालिका	६	होली
१७	भगवती माध्यमिक विद्यालय	जाजरकोट	बारेकोट गाउँपालिका	४	जिरी
१८	कालिका आदर्श माध्यमिक विद्यालय	जाजरकोट	बारेकोट गाउँपालिका	१	रामिडाँडा
१९	भेरी दोभान माध्यमिक विद्यालय	रुकुम पश्चिम	सानीभेरी गाउँपालिका	१	चिनाबगर
२०	जनकल्याण माध्यमिक विद्यालय	रुकुम पश्चिम	आठबीसकोट नगरपालिका	११	गोइरी
२१	ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालय	रुकुम पश्चिम	आठबीसकोट नगरपालिका	४	गोतामकोट
२२	जनता माध्यमिक विद्यालय	रुकुम पश्चिम	आठबीसकोट नगरपालिका	१०	झिन्चौर
२३	लक्ष्मी प्राप्ति माध्यमिक विद्यालय	जाजरकोट	कुशे गाउँपालिका	५	खुर्पा
२४	जनता माध्यमिक विद्यालय	जाजरकोट	कुशे गाउँपालिका	७	समैला
२५	तपोधेनु माध्यमिक विद्यालय	जाजरकोट	कुशे गाउँपालिका	१	काफलपाटा
२६	राम माध्यमिक विद्यालय	जाजरकोट	छेडागाड नगरपालिका	१०	खाल्टाकुरा
२७	शंकरस्थान माध्यमिक विद्यालय	जाजरकोट	छेडागाड नगरपालिका	२	मजेरी
२८	शिवपुरी माध्यमिक विद्यालय	जाजरकोट	जुनिचाँदे गाउँपालिका	५	गाखाकोट
२९	नारायणचौर माध्यमिक विद्यालय	जाजरकोट	जुनिचाँदे गाउँपालिका	१	काप्रा

ख. JICA को ऋण सहयोगमा पुनर्निर्माण भइरहेका विद्यालयहरू:

क्र.सं.	विद्यालयको नाम	जिल्ला	स्थानीय तह	वडा नं.	स्थान
१	श्री त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय	जाजरकोट	भेरी नगरपालिका	३	खलंगा
२	श्री विजय माध्यमिक विद्यालय	जाजरकोट	भेरी नगरपालिका	५	काफलचौर
३	श्री सरस्वती माध्यमिक विद्यालय	जाजरकोट	भेरी नगरपालिका	७	पुन्मा
४	श्री दीपेन्द्र माध्यमिक विद्यालय	जाजरकोट	भेरी नगरपालिका	९	भुर
५	श्री शिव शंकर माध्यमिक विद्यालय	जाजरकोट	भेरी नगरपालिका	११	जगतिपुर
६	श्री भगवती माध्यमिक विद्यालय	जाजरकोट	भेरी नगरपालिका	१३	कुदु
७	श्री मष्टा आधारभूत विद्यालय	जाजरकोट	भेरी नगरपालिका	८	गुमा
८	श्री जनकल्याण आधारभूत विद्यालय	जाजरकोट	नलगाड नगरपालिका	८	रघुनाथ

९	श्री जुनी बाल संरक्षण माध्यमिक विद्यालय	जाजरकोट	नलगाड नगरपालिका	५	सिक्रे
१०	श्री वीरेन्द्र हिमालय माध्यमिक विद्यालय	जाजरकोट	नलगाड नगरपालिका	१२	टल्लु
११	श्री त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय	जाजरकोट	नलगाड नगरपालिका	७	दल्ली

ग. Global Partnership in Education (GPE) Fund मार्फत पुनर्निर्माण भइरहेका विद्यालयहरू:

जिल्ला: बझाङ			
क्र.सं.	विद्यालयको नाम	स्थानीय तह/स्थान	वडा नं.
१	सरस्वती विद्यामन्दिर माध्यमिक विद्यालय	मष्टा गाउँपालिका, रानाडा	१
२	दुर्गा भवानी माध्यमिक विद्यालय	तलकोट गाउँपालिका	५
३	हिमालय माध्यमिक विद्यालय	तलकोट गाउँपालिका	७
४	सुनिकोट माध्यमिक विद्यालय	तलकोट गाउँपालिका	१
५	सत्यवादी माध्यमिक विद्यालय	जयपृथ्वी नगरपालिका	
६	चक्रेश्वर माध्यमिक विद्यालय	थलारा गाउँपालिका	९
७	बानिचौर साधारण तथा प्राविधिक माध्यमिक विद्यालय	छुबिस पाथिभेरा गाउँपालिका	
८	बाल विकास माध्यमिक विद्यालय	जयपृथ्वी नगरपालिका	४
९	सुनिपिपलचौर माध्यमिक विद्यालय	जयपृथ्वी नगरपालिका	७

घ. विद्यालय व्यवस्थापन समिति मार्फत विद्यालय पुनर्निर्माण विवरण: (नेपाल सरकार स्रोत)

आ.व. २०८१/८२

क्रस	जिल्ला	कक्षाकोठा संख्या	रकम रू लाखमा
१	जाजरकोट	७८	१४८२
२	रूकुम पश्चिम	३२	६४६
३	बझाङ	३४	६०८
	जम्मा	१४४	२७३६

आ. व. २०८२/८३

क्र स	जिल्ला	प्रस्तावित कोटा संख्या	प्रस्तावित बजेट रु लाखमा	क्र स	जिल्ला	प्रस्तावित कोटा संख्या	प्रस्तावित बजेट रु लाखमा
१	डोल्पा	६	११४	९	बैतडी	६	११४
२	सुर्खेत	८	१५२	१०	डोटी	१२	२२८
३	दैलेख	१०	१९०	११	डडेलधुरा	६	११४
४	कालिकोट	१२	२२८	१२	दार्चुला	६	११४
५	जुम्ला	१०	१९०	१३	बाजुरा	८	१५२
६	सल्यान	१२	२२८	१४	बझाङ	१४	२६६
७	जाजरकोट	८	१५२	१५	अछाम	१०	१९०
८	रुकुम पश्चिम	६	११४	जम्मा कोटा १३४ वटा कक्षाकोठा जम्मा बजेट रु २५ करोड ४६ लाख			

ड. दुई हजार भन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयको थप भौतिक पूर्वाधार विकासको लागि छनोट भएका विद्यालय विवरणः

क्र स	विद्यालय कोड	नगरपालिका	जिल्ला	विद्यालयको नाम	कार्य विवरण २०८२ चैत्रसम्ममा
१	140430031	त्रियुगा नगरपालिका	उदयपुर	त्रियुगा नमूना माध्यमिक विद्यालय	१२ कोठे भवनको दोस्रो तल्लाको छत ढलान सम्पन्न भएको ।
२	140170008	कटारी नगरपालिका	उदयपुर	त्रिवेणी माध्यमिक विद्यालय	लागत अनुमानको तयारी भइरहेको ।
३	720110002	भीमदत्त नगरपालिका	कञ्चनपुर	महेन्द्रनगर माध्यमिक विद्यालय	लागत अनुमानको तयारी भइरहेको ।
४	490140017	शिवराज नगरपालिका	कपिलवस्तु	नेपाल आदर्श माध्यमिक विद्यालय	१२ कोठे भवनको ढलानसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भएको, शौचालय भवनको छत ढलान सम्पन्न भएको ।
५	500060003	बाणगंगा नगरपालिका	कपिलवस्तु	जनता माध्यमिक विद्यालय	लागत अनुमानको तयारी भइरहेको ।
६	270230007	कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका	काठमाडौं	गान्धी माध्यमिक विद्यालय	वोलपत्र सूचना प्रकाशन भै प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन कार्य भइरहेको
७	400320075	पोखरा महानगरपालिका	कास्की	अमरसिंह माध्यमिक विद्यालय	१२ कोठे भवनको पहिलो तल्लाको छत ढलान सम्पन्न भएको, शौचालय भवनको जगको ढलान सम्पन्न भएको ।

क्र स	विद्यालय कोड	नगरपालिका	जिल्ला	विद्यालयको नाम	कार्य विवरण २०८२ चैत्रसम्ममा
८	400320052	पोखरा महानगरपालिका	कास्की	कालिका माध्यमिक विद्यालय	बोलपत्र सूचना प्रकाशन भै आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन कार्य भइरहेको
९	400320036	पोखरा मनगरपालिका	कास्की	छोरेपाटन माध्यमिक विद्यालय	लागत अनुमानको तयारी भइरहेको ।
१०	710100070	धनगढी उप महानगरपालिका	कैलाली	त्रिनगर माध्यमिक विद्यालय	१२ कोठे भवनको भुइ तल्लाको छत ढलान सम्पन्न भएको ।
११	710230005	गोदावरी नगरपालिका	कैलाली	दुर्गालक्ष्मी मोडेल माध्यमिक विद्यालय	लागत अनुमानको तयारी भइरहेको ।
१२	710420018	टीकापुर नगरपालिका	कैलाली	कर्णाली माध्यमिक विद्यालय	लागत अनुमानको तयारी भइरहेको ।
१३	350050060	भरतपुर महानगरपालिका	चितवन	नारायणी नमूना माध्यमिक विद्यालय	होस्टेल आवश्यक रहेकोले कक्षाकोठा निर्माण कार्य शुरू नभएको
१४	630040004	चन्दननाथ नगरपालिका	जुम्ला	चन्दननाथ माध्यमिक विद्यालय	लागत अनुमानको तयारी भइरहेको ।
१५	040370021	मेचीनगर नगरपालिका	झापा	धुलाबारी माध्यमिक विद्यालय	१२ कोठे भवनको ढलान तथा गारोसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भई प्लाष्टरको कार्य भइरहेको, शौचालय भवनको छत ढलान सम्पन्न भएको ।
१६	040120041	दमक नगरपालिका	झापा	हिमालय माध्यमिक विद्यालय	१२ कोठे भवनको ढलान तथा गारोसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भई प्लाष्टरको कार्य भइरहेको, शौचालय भवनको छत ढलान सम्पन्न भएको ।
१७	040010017	वित्तामोड नगरपालिका	झापा	देवी माध्यमिक विद्यालय	१२ कोठे भवनको भुइ तल्लाको छत ढलान सम्पन्न भएको ।
१८	040010018	वित्तामोड नगरपालिका	झापा	महेन्द्र रत्न माध्यमिक विद्यालय	लागत अनुमानको तयारी भइरहेको ।
१९	40480011	कन्काई नगरपालिका	झापा	कन्काई माध्यमिक विद्यालय	लागत अनुमानको तयारी भइरहेको ।
२०	40110004	वित्तामोड नगरपालिका	झापा	मोहनमाया माध्यमिक विद्यालय	लागत अनुमानको तयारी भइरहेको ।

क्र स	विद्यालय कोड	नगरपालिका	जिल्ला	विद्यालयको नाम	कार्य विवरण २०८२ चैत्रसम्ममा
२१	380110032	व्यास नगरपालिका	तनहुँ	सत्यवती माध्यमिक विद्यालय	आवश्यक जमिन नभएकोले निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको ।
२२	10320004	फुङ्लिङ नगरपालिका	ताप्लेजुङ	भानु माध्यमिक विद्यालय	लागत अनुमानको तयारी भइरहेको ।
२३	560390039	घोरही उप महानगरपालिका	दाङ	पद्मोदय पब्लिक माध्यमिक विद्यालय	१२ कोठे भवनको दोस्रो तल्लाको छत ढलान सम्पन्न भएको, शौचालय भवनको गारो लगाउने कार्य सम्पन्न भएको ।
२४	560390028	घोरही उप महानगरपालिका	दाङ	माध्यमिक विद्यालय रजेना	वोलपत्र सूचना प्रकाशन भै आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन कार्य भइरहेको
२५	560400012	तुलसीपुर उप महानगरपालिका	दाङ	माध्यमिक विद्यालय तुलसीपुर सेन्टर	लागत अनुमानको तयारी भइरहेको ।
२६	560230008	तुलसीपुर उप महानगरपालिका	दाङ	सिद्ध रत्न माध्यमिक विद्यालय	लागत अनुमानको तयारी भइरहेको ।
२७	560400003	तुलसीपुर उप महानगरपालिका	दाङ	गुरु जजुर माध्यमिक विद्यालय	लागत अनुमानको तयारी भइरहेको ।
२८	560390014	घोराही उप महानगरपालिका	दाङ	बाल विकास माध्यमिक विद्यालय	लागत अनुमानको तयारी भइरहेको ।
२९	750220008	महाकाली नगरपालिका	दार्चुला	महेन्द्र मोडल माध्यमिक विद्यालय	१२ कोठे भवनको प्लिन्थ विम ढलान सम्पन्न भएको ।
३०	170480035	जनकपुरधाम उप महानगरपालिका	धनुषा	शंकट मोचन देवशरण माध्यमिक विद्यालय	१२ कोठे भवनको जग विमको ढलान सम्पन्न भएको ।
३१	17088001	विदेह नगरपालिका	धनुषा	जनता मोडेल माध्यमिक विद्यालय	१२ कोठे भवनको भुइ तल्लाको छत ढलान सम्पन्न भएको ।
३२	170980003	मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिका	धनुषा	विद्यानाथ देवनारायण जनता मोडेल विद्यालय	लागत अनुमानको तयारी भइरहेको ।
३३	170130001	जनकपुरधाम उप महानगरपालिका	धनुषा	गोगल प्रसाद नमुना माध्यमिक विद्यालय	लागत अनुमानको तयारी भइरहेको ।

क्र स	विद्यालय कोड	नगरपालिका	जिल्ला	विद्यालयको नाम	कार्य विवरण २०८२ चैत्रसम्ममा
३४	170480128	जनकपुर उप महानगरपालिका	धनुषा	याज्ञवल्क्य संस्कृत माध्यमिक विद्यालय	लागत अनुमानको तयारी भइरहेको ।
३५	480210014	गैडाकोट नगरपालिका	नवलपरासी सुस्ता पुर्व	जनक माध्यमिक विद्यालय	लागत अनुमानको तयारी भइरहेको ।
३६	480150006	देवचुली नगरपालिका	नवलपरासी सुस्ता पुर्व	भीमसेन आदर्श माध्यमिक विद्यालय	लागत अनुमानको तयारी भइरहेको ।
३७	340200041	विरगञ्ज महानगरपालिका	पर्सा	नरसिंह माध्यमिक विद्यालय	विद्यालयले पुरानो भवन भत्काउन ढिला गरेको तथा जग्गा विवादले कार्य शुरु हुन नसकेको ।
३८	340200001	विरगञ्ज महानगरपालिका	पर्सा	त्रिजुद्ध महावीर रघुवीर दास माध्यमिक विद्यालय	लागत अनुमानको तयारी भइरहेको ।
३९	340620003	पोखरिया नगरपालिका	पर्सा	जिल्ला उचाङ्गाल रामदेव - कलवार माध्यमिक विद्यालय	लागत अनुमानको तयारी भइरहेको ।
४०	340200096	विरगञ्ज मनगरपालिका	पर्सा	माइस्थान विद्यापिठ माध्यमिक विद्यालय	लागत अनुमानको तयारी भइरहेको ।
४१	20290001	फिदिम नगरपालिका	पाँचथर	फिदिम माध्यमिक विद्यालय	लागत अनुमानको तयारी भइरहेको ।
४२	470530003	रामपुर नगरपालिका	पाल्पा	रामतुलसी माध्यमिक विद्यालय	वोलपत्र सूचना प्रकाशन भै आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन कार्य भइरहेको
४३	570250010	कोहलपुर नगरपालिका	बाँके	त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय	१२ कोठे भवनको दोश्रो तल्लाको छत ढलान सम्पन्न भएको, शौचालय भवनको गारो लगाउने कार्य भइरहेको ।
४४	270320014	नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका	बाँके	धम्बोझी माध्यमिक विद्यालय	वोलपत्र सूचना प्रकाशन भै आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन कार्य भइरहेको
४५	570320017	नेपालगञ्ज उप महानगरपालिका	बाँके	मङ्गलप्रसाद माध्यमिक विद्यालय	लागत अनुमानको तयारी भइरहेको ।
४६	670230010	बडीमालिका नगरपालिका	वाजुरा	मालिका माध्यमिक विद्यालय	लागत अनुमानको तयारी भइरहेको ।

क्र स	विद्यालय कोड	नगरपालिका	जिल्ला	विद्यालयको नाम	कार्य विवरण २०८२ चैत्रसम्ममा
४७	330470005	जितपुर सिमरा उप महानगरपालिका	बारा	नेपाल राष्ट्रिय मोडल माध्यमिक विद्यालय	लागत अनुमानको तयारी भइरहेको ।
४८	330520018	कलैया उप महानगरपालिका	बारा	दुर्गा माध्यमिक विद्यालय	लागत अनुमानको तयारी भइरहेको ।
४९	330680010	निजगढ नगरपालिका	बारा	गौरीशंकर माध्यमिक विद्यालय	लागत अनुमानको तयारी भइरहेको ।
५०	330140003	महागढीमाई नगरपालिका	बारा	गढीमाई महेन्द्र प्राविधिक माध्यमिक विद्यालय	लागत अनुमानको तयारी भइरहेको ।
५१	330520019	कलैया उप महानगरपालिका	बारा	श्री ३ चन्द्र माध्यमिक विद्यालय	लागत अनुमानको तयारी भइरहेको ।
५२	180420001	लोहरपट्टी नगरपालिका	महोत्तरी	भेरुखी माध्यमिक विद्यालय	१२ कोठे भवनको भुइ तल्लाको छत ढलान सम्पन्न भएको ।
५३	180530001	साम्सी गाउँपालिका	महोत्तरी	राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय	लागत अनुमानको तयारी भइरहेको ।
५४	180600004	रामगोपाल पुर नगरपालिका	महोत्तरी	महेन्द्र रा माध्यमिक विद्यालय	लागत अनुमानको तयारी भइरहेको ।
५५	050580009	सुन्दरहरैचा नगरपालिका	मोरङ	साजीलाल माध्यमिक विद्यालय	लागत अनुमानको तयारी भइरहेको ।
५६	50640012	उर्लावारी नगरपालिका	मोरङ	राधिका माध्यमिक विद्यालय	लागत अनुमानको तयारी भइरहेको ।
५७	50450009	पथरीशनिश्चरे नगरपालिका	मोरङ	पञ्चायत माध्यमिक विद्यालय	लागत अनुमानको तयारी भइरहेको ।
५८	050270013	सुन्दरहरैचा नगरपालिका	मोरङ	सुकुना माध्यमिक विद्यालय	१२ कोठे भवनको ढलान तथा गारोसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भई प्लाष्टरको कार्य भइरहेको, शौचालय भवनको छत ढलान सम्पन्न भएको ।
५९	050140027	विराटनगर महानगरपालिका	मोरङ	पोखरिया माध्यमिक विद्यालय	१२ कोठे भवनको भुइ तल्लाको छत ढलान सम्पन्न भएको ।
६०	050140060	विराटनगर महानगरपालिका	मोरङ	आदर्श माध्यमिक विद्यालय	१२ कोठे भवनको भुइ तल्लाको छत ढलान सम्पन्न भएको ।

क्र स	विद्यालय कोड	नगरपालिका	जिल्ला	विद्यालयको नाम	कार्य विवरण २०८२ चैत्रसम्ममा
६१	490140030	बुटवल उप महानगरपालिका	रुपन्देही	कालिका मानव ज्ञान माध्यमिक विद्यालय	१२ कोठे भवनको भुइ तल्लाको छत ढलानको तयारी भइरहेको ।
६२	490140033	बुटवल उप महानगरपालिका	रुपन्देही	नविन औद्योगिक रिता माध्यमिक विद्यालय	१२ कोठे भवनको भुइ तल्लाको छत ढलान सम्पन्न भएको ।
६३	490020006	तिलोत्तमा नगरपालिका	रुपन्देही	शान्ति नमुना माध्यमिक विद्यालय	१२ कोठे भवनको पहिलो तल्लाको छत ढलान सम्पन्न भएको ।
६४	490140017	बुटवल उप महानगरपालिका	रुपन्देही	कान्ति बैरम माध्यमिक विद्यालय	लागत अनुमानको तयारी भइरहेको ।
६५	410180007	सियारी गाँउपालिका	रुपन्देही	पब्लिक माध्यमिक विद्यालय	लागत अनुमानको तयारी भइरहेको ।
६६	490220010	सैनामैना नगरपालिका	रुपन्देही	रामपुर माध्यमिक विद्यालय	लागत अनुमानको तयारी भइरहेको ।
६७	490520009	सैनामैना नगरपालिका	रुपन्देही	सैनामैना माध्यमिक विद्यालय	लागत अनुमानको तयारी भइरहेको ।
६८	490630024	सिद्धार्थनगर नगरपालिका	रुपन्देही	रुपन्देही लीलाराम न्यौपाने माध्यमिक विद्यालय	लागत अनुमानको तयारी भइरहेको ।
६९	530310001	रोल्पा नगरपालिका	रोल्पा	बालकल्याण माध्यमिक विद्यालय	बोलपत्र सूचना प्रकाशन भै आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन कार्य भइरहेको
७०	320580001	गढीमाई नगरपालिका	रौतहट	सरस्वती माध्यमिक विद्यालय	१२ कोठे भवनको पहिलो तल्लाको छत ढलान सम्पन्न भएको ।
७१	320500002	कटहरिया नगरपालिका	रौतहट	कटहरिया माध्यमिक विद्यालय	१२ कोठे भवनको दोश्रो तल्लाको छत ढलान सम्पन्न भएको ।
७२	160560003	मौलापुर नगरपालिका	रौतहट	जनता माध्यमिक विद्यालय सोनरनिया	१२ कोठे भवनको भुइ तल्लाको छत ढलान सम्पन्न भएको ।
७३		गौर नगरपालिका	रौतहट	जुद्ध माध्यमिक विद्यालय	लागत अनुमानको तयारी भइरहेको ।
७४	320330040	राजदेवी नगरपालिका	रौतहट	नेमधारी बासुदेव नमुना माध्यमिक विद्यालय	लागत अनुमानको तयारी भइरहेको ।
७५	320120001	गरुडा नगरपालिका	रौतहट	रामचन्द्र माध्यमिक विद्यालय	लागत अनुमानको तयारी भइरहेको ।

क्र स	विद्यालय कोड	नगरपालिका	जिल्ला	विद्यालयको नाम	कार्य विवरण २०८२ चैत्रसम्ममा
७६	320290001	वृन्दावन नगरपालिका	रौतहट	नमुना माध्यमिक विद्यालय वरगजवा	लागत अनुमानको तयारी भइरहेको ।
७७	320190001	चन्द्रपुर नगरपालिका	रौतहट	जनज्योति माध्यमिक विद्यालय	लागत अनुमानको तयारी भइरहेको ।
७८	320220001	देवाही गोनाही गाँउपालिका	रौतहट	जय किसन माध्यमिक विद्यालय	लागत अनुमानको तयारी भइरहेको ।
७९	320680003	मौलापुर नगरपालिका	रौतहट	माध्यमिक विद्यालय पथरा बुधराम	लागत अनुमानको तयारी भइरहेको ।
८०	320130001	दुर्गा भगवती गाँउपालिका	रौतहट	सरस्वती माध्यमिक विद्यालय	लागत अनुमानको तयारी भइरहेको ।
८१	190430004	इश्वरपुर नगरपालिका	सर्लाही	नारायण माध्यमिक विद्यालय	१२ कोठे भवनको दोश्रो तल्लाको छत ढलान सम्पन्न भएको, शौचालय भवनको जगको कार्य सम्पन्न ।
८२	190560009	लालबन्दी नगरपालिका	सर्लाही	जनज्योती माध्यमिक विद्यालय	लागत अनुमानको तयारी भइरहेको ।
८३	190340001	गोडैता नगरपालिका	सर्लाही	बेनीभोला मोडेल माध्यमिक विद्यालय	लागत अनुमानको तयारी भइरहेको ।
८४	160900006	मिर्चैया नगरपालिका	सिरहा	मोहन माध्यमिक विद्यालय	लागत अनुमानको तयारी भइरहेको ।
८५	160970009	सिराहा नगरपालिका	सिराहा	चन्द्र माध्यमिक विद्यालय	१२ कोठे भवनको भुइ तल्लाको छत ढलान सम्पन्न भएको ।
८६	60110010	बराहक्षेत्र नगरपालिका	सुनसरी	जगन्नाथ डेडराज जनता माध्यमिक विद्यालय	लागत अनुमानको तयारी भइरहेको ।
८७	060180009	धरान उप महानगरपालिका	सुनसरी	पब्लिक हाई स्कुल	१२ कोठे भवनको ढलान तथा गारोसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भई प्लाष्टरको कार्य भइरहेको, शौचालय भवनको छत ढलान सम्पन्न भएको ।
८८	590070028	विरेन्द्रनगर नगरपालिका	सुर्खेत	अमरज्योति माध्यमिक विद्यालय	१२ कोठे भवनको पहिलो तल्लाको छत ढलान सम्पन्न भएको ।
८९	590070030	विरेन्द्रनगर नगरपालिका	सुर्खेत	जन माध्यमिक विद्यालय	वोलपत्र सूचना प्रकाशन भै आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन कार्य भइरहेको

४. आयोजनाको सोच, उद्देश्य र रणनीति:

I. सोच:

सुदृढ, सुरक्षित र बाल एवम् अपांगमैत्री र विपद् उत्थानशील शैक्षिक संस्थाको भौतिक पूर्वाधार विकास ।

II. उद्देश्य:


- भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सामुदायिक विद्यालयहरूको क्षतिको अभिलेख र पुनर्निर्माणको आवश्यकता अद्यावधिक गर्दै पुनर्निर्माणको योजना तर्जुमा गर्नु,
- सबै प्रकारका विपद् प्रतिरोधक र अझ सुदृढ भौतिक संरचना तयार हुने गरी विद्यालयहरूको पुनर्निर्माण र प्रवलीकरण सञ्चालन गर्नु,
- विद्यालय पुनर्निर्माणको अभियानमा योगदान गर्ने दाताहरू, सङ्घ संस्थाहरू र विभिन्न साझेदारहरूबिच सञ्चार, समन्वय गरी विद्यालय पुनर्निर्माण कार्यको लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु,
- नेपाल सरकार र विभिन्न दातृ निकायबिच भएका विद्यालय पुनर्निर्माण सम्बन्धी सम्झौता अनुसारका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्नु,
- विद्यार्थी संख्या उच्च रहेका भौतिक पूर्वाधार पर्याप्त नरहेको विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्नु,
- विद्यालय पुनर्निर्माण कार्यमा गुणस्तरीयता कायम गर्न अनुगमन, सुपरीवेक्षण गर्नु,

III. रणनीति:

- विद्यालय क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न क्षेत्रसँग सहकार्य गरी विकास साझेदारहरू, मानवतावादी सङ्घ संस्थाहरू एवम् व्यक्तिहरू तथा सबै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूको सहयोग विद्यालय पुनर्निर्माण कार्यको कार्य गर्ने ।
- पुनर्निर्माण गर्दा Build Back Better को विश्वव्यापी अवधारणालाई आत्मसाथ गरी विद्यालय भवन एवम् भौतिक पूर्वाधारहरू बालमैत्री, वातावरण मैत्री, लैंगिक मैत्री र विपद् प्रतिरोधी बनाउने नीति प्रभावकारी रूपले लागू गर्ने ।
- नेपाल राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिता एवम् भवन निर्माण सम्बन्धी प्रचलित मापदण्डहरू पूर्णपालना हुने गरी गुणस्तरयुक्त विधि एवम् प्रणाली अनुसार पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने ।
- पुनर्निर्माण कार्यमा स्थानीय जनताको अपनत्व बढाउन विद्यालय परिवार (विद्यालय व्यवस्थापन समिति, विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक आदिको) प्रभावकारी रूपमा परिचालित गरी पारदर्शी ढङ्गले पुनर्निर्माण गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने ।
- पुनर्निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित, योजनाबद्ध एवम् प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन संरचनागत व्यवस्थाको साथसाथै दक्ष कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन एवम् क्षमता विकास कार्यक्रम गर्ने ।
- पुनर्निर्माण गर्दा सकेसम्म स्थानीय सामग्री एवम् प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने ।
- दुई हजार भन्दा बढी विद्यार्थी संख्या रहेका विद्यालयको आवश्यकताका आधारमा भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने ।

५. संगठन संरचना,शाखागत कार्य विवरण र कर्मचारी विवरण:

i. संगठन संरचना:

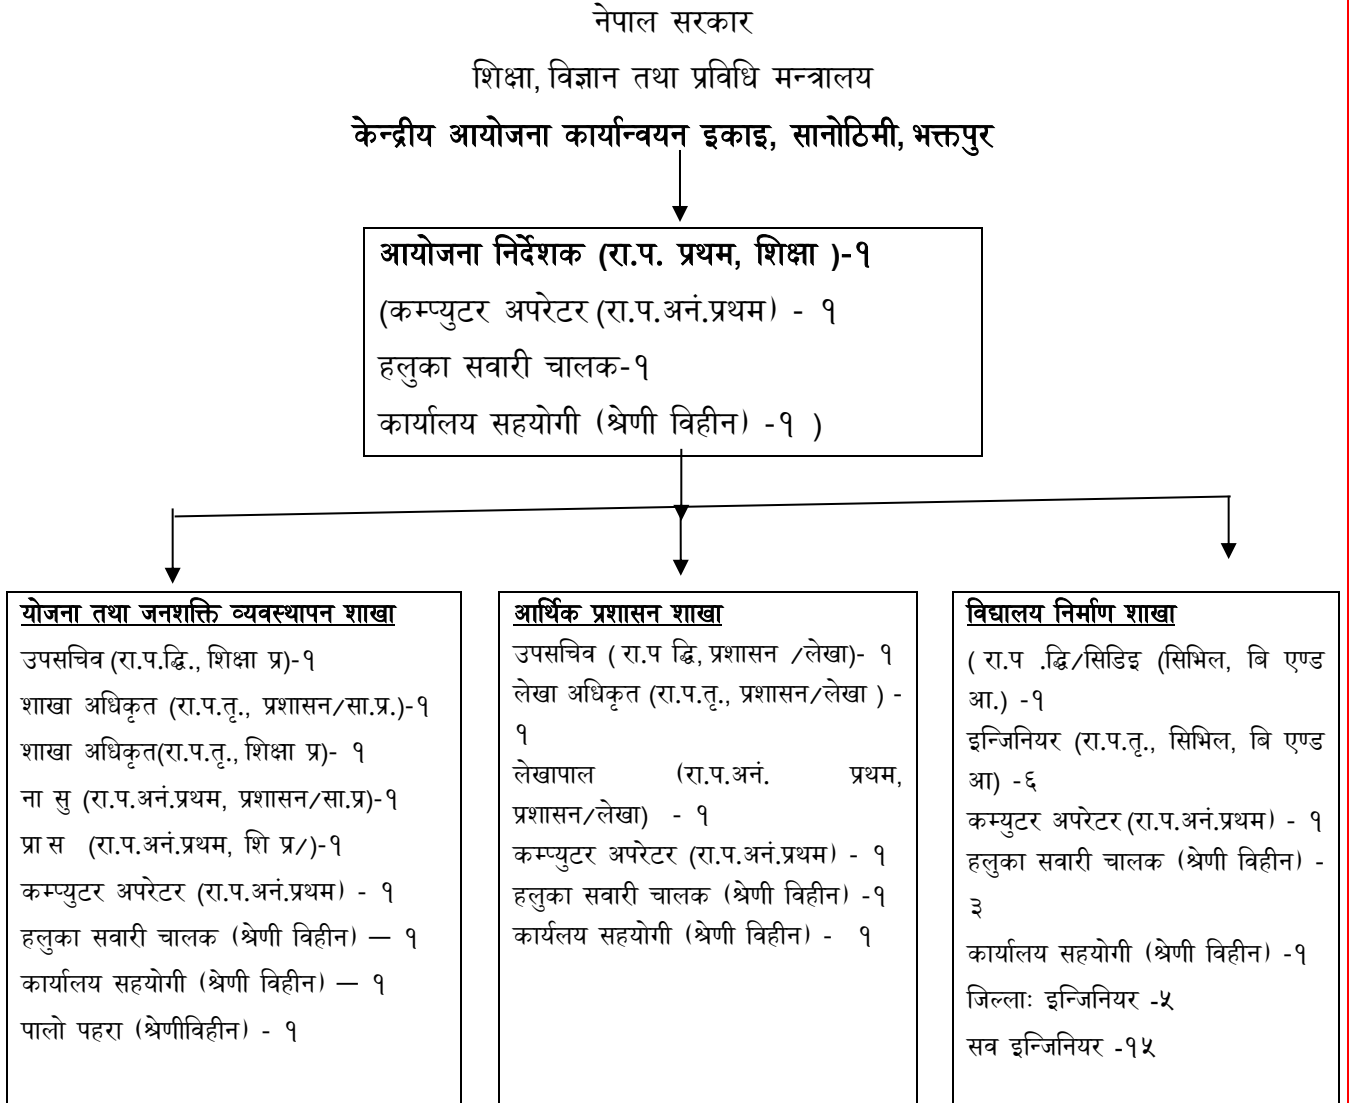

ii. शाखागत कार्य विवरण:

क. विद्यालय पुनर्निर्माण शाखा

- भूकम्पबाट भएको सामुदायिक विद्यालयहरूको क्षतिको अभिलेख र पुनर्निर्माणको आवश्यकता अध्यावधिक गर्दै पुनर्निर्माणको योजना तर्जुमा गर्ने ।
- विद्यालय पुनर्निर्माणको अभियानमा योगदान गर्ने दाताहरू, संघ संस्थाहरू र विभिन्न साझेदारहरू बिच सञ्चार, समन्वय गरी विद्यालय पुनर्निर्माण कार्यको लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने ।
- परामर्शदाताबाट पेश भएका विद्यालयहरूको लागत अनुमान चेकजाँच गरी स्वीकृतीका लागि पेश गर्ने ।

- विद्यालय पुनर्निर्माण कार्यको निरन्तर अनुगमन गर्ने निर्धारित मापदण्ड गुणस्तर र प्रक्रियाबाट निर्माण कार्य गर्न सम्बन्धित व्यक्ति, समुदाय, संघसंस्था, निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिने तथा निरन्तर पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने ।
- विद्यालयको पुनर्निर्माणको काममा कुनै समस्या उत्पन्न भएमा निर्माण कार्य रोक्ने निर्धारित गुणस्तर मापदण्ड अनुशरण भएको नपाइएमा सम्बन्धित पक्षलाई कारवाही गर्ने ।
- विद्यालय पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित सरकारी निकाय एवम् सम्बन्धित सरोकारवाला विच समन्वय गर्ने ।
- जोखिममुक्त विद्यालय संरचना भनी प्राविधिक कर्मचारीबाट एकिन भएका विद्यालय भौतिक संरचनाहरू भत्काउन निर्णय लिनु वा स्वीकृत दिने ।
- केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा कार्यरत कर्मचारीहरूको क्षमता विकासको योजना बनाई कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
- विद्यालयको पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा भएको आर्थिक तथा भौतिक प्रगतिको समिक्षा गर्ने विवरण राख्ने र निरन्तर रूपमा मन्त्रालयमा प्रगति विवरण पेश गर्ने ।
- केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने पुरस्कृत गर्ने, पुरस्कारका लागि सिफारिस गर्ने र कारवाही गर्ने ।
- शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरूमा स्वीकृत दरबन्दीका आधारमा प्राविधिक कर्मचारी पदपूर्तीको व्यवस्थापन गर्ने कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा म्याद थप गर्ने नगर्ने निर्णय लिने । इकाइहरू अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरूको काज र सरुवा व्यवस्थापन गर्ने ।
- विद्यालय पुनर्निर्माणको कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा संचालन गर्न केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरूमा आवश्यकता अनुसार प्राविधिक र समन्वय समितिहरू गठन गरी जिम्मेवारी तोक्ने ।
- विद्यालय पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजना संचालन गर्ने ।
- सञ्चालन भइरहेका कामहरूको परिमाण र गुणस्तरको सम्बन्धमा विचैमा छुड्के जाँच गर्ने, गराउने र आवश्यक ठानेमा सम्पादित कामको गुणस्तरको प्रयोगशाला परीक्षण (Lab Test) समेत गर्ने गराउने ।
- भूकम्प पश्चात गरिने विद्यालयहरूको पुनर्निर्माणको लागि खरिद कार्य गर्ने ।
- खरिद गुरुयोजना बनाउने, बोलपत्रका कागजात तयार गर्ने ।
- बोलपत्र आवहानको सूचना प्रकाशनको कारवाही अगाडी बढाउने ।
- बोलपत्रहरूको मूल्याङ्कन गरी बोलपत्र मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्ने ।
- ठेक्का सम्झौताका कागजात तयार गर्ने ।
- जिल्लास्तरमा संचालित विद्यालय पुनर्निर्माण कार्यमा गुणस्तरीयता कायम गर्न अनुगमन, सुपरिवेक्षण गर्ने ।
- नेपाल सरकार र विभिन्न दातृनिकाय विच भएका विद्यालय पुनर्निर्माण सम्बन्धी सम्झौता अनुसारको आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने ।

- प्राकृतिक विपद् प्रतिरोधक र अझ सुदृढ भौतिक संरचना तयार हुने विद्यालयहरूको पुनर्निर्माण र प्रवलीकरण संचालन गर्ने ।
- परामर्शदाताबाट पेश भएका विद्यालयहरूको डिजाइन तथा लागत अनुमान चेकजाँच गरी स्वीकृतीका लागि पेश गर्ने ।
- विद्यालय पुनर्निर्माण सम्बन्धी अन्य कार्य गराउने ।

ख. योजना तथा जनशक्ति व्यवस्थापन शाखा

- स्वीकृत दरबन्दी अनुसार कर्मचारीहरूको नियुक्ति र सरुवा
- स्वीकृत अस्थायी दरबन्दी अनुसार आवश्यक जनशक्ति करार नियुक्ति र परिचालन
- कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्य
- कर्मचारीहरूको तालिम एवं क्षमता विकास सम्बन्धी कार्य गर्ने
- कर्मचारीको दण्ड र पुरस्कार सम्बन्धी
- कर्मचारीको हाजिरी र असाधारण विदा बाहेक अन्य विदा स्वीकृत तथा अभिलेखन
- कार्यालयको मूल दर्ता तथा चलानी सम्बन्धी
- जिल्लागत काज भ्रमण तथा बैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन सम्बन्धी
- नियमित स्टाफ बैठक सम्बन्धी
- जनशक्ति परिचालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी
- कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी
- मन्त्रालयले तोकेको कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी अन्य कार्यहरू
- आयोजना निर्देशकबाट निर्देशन भए बमोजिम अन्य कार्यहरू गर्ने गराउने
- भिसा सिफारिश सम्बन्धी कार्य
- जिन्सी व्यवस्थापन कार्य
- खरीद कार्यमा सहयोग गरी सोको व्यवस्थापन गर्ने ।
- पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने गराउने
- वार्षिक कार्यक्रम एवं बजेट तर्जुमाको खाका तयार गर्न प्राप्त अनुमानित बजेटलाई मध्यकालीन खर्च संरचना र प्राथमिकताको आधारमा अन्तर्गतका निकायहरूलाई निर्देशन दिने समन्वय गर्ने एवं बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्ने ।
- स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको संशोधन तद् अनुरूपको बजेटको हेरफेर (थप बजेट तथा रकमान्तर) गर्ने गराउने ।
- पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनासँग सम्बन्धित तथ्याङ्कहरूको संकलन, प्रशोधन र व्यवस्थापन गर्ने
- पुनर्निर्माण सम्बन्धी निती तथा योजना तयारीका लागि सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरू सँग समन्वय गर्ने ।
- पुनर्निर्माण सम्बन्धी अल्पकालिन, मध्यकालिन एवं दीर्घकालीन कार्ययोजना तयारी, कार्यान्वयन, समन्वय र सम्पादित कामप्रति अनुगमन गर्ने गराउने ।
- केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरूबाट मन्त्रालयमा पेश गर्न पत्राचार गर्ने र प्राप्त भएपछि वार्षिक कार्यक्रम अनुसार जाँच गरी गराई सारांश प्रतिवेदन तयार गर्ने गराउने ।

- बार्षिक कार्यक्रम अनुसार सञ्चालन भई रहेका पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यहरूको अनुगमन गर्ने (परिमाण, गुणस्तर)आदिको सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित प्राविधिकहरू समेत खटाई छुड्के जाँच गर्ने गराउने र सोको प्रतिवेदन लिई देखिएको अवस्थाको राय सहित पेश गर्ने ।
- आयोजना कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि प्राप्त प्रतिवेदन तथा निरीक्षणको आधारमा प्रतिफल उपलब्धी मूल्याङ्कन गर्ने गराउने र आयोजनाहरूको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने गराउने ।
- पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यहरूको कार्यसम्पादन परिसूचक तयार गरी कर्मचारीको प्रोत्साहनसँग आवद्ध गर्ने ।
- तथ्याङ्क अध्यावधिक गर्ने गराउने ।
- नीतिगत, कार्यक्रमगत वा प्रक्रियागत निर्णयका लागि राय माग भई आएमा संलग्न सान्दर्भिक दस्तावेज अध्ययन गरी राय पेश गर्ने ।
- कार्यालयको कामलाई सरल र सहज बनाउन आवश्यक पर्ने सफ्टवेयर निर्माण कार्य गराउने ।
- कार्यालयको Website तथा अन्य सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने ।
- आफू अन्तर्गतका सबै कार्यालयहरूलाई सूचना सञ्जालमा जोड्ने कार्य गर्ने गराउने ।
- गैर सरकारी संस्था तथा दातृ निकायबाट हुने कार्यको अनुगमन , सहजीकरण र समन्वय गर्ने ।
- माथिल्लो निकायमा प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्ने ।

ग. आर्थिक प्रशासन शाखा

- केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइको आम्दानी र खर्चको श्रेस्ता प्रचलित कानून बमोजिम व्यवस्थित रूपमा राख्ने, राख्न लगाउने ।
- खर्चको फाँटबारी, आर्थिक विवरण लगायत प्रचलित कानून बमोजिम तयार गर्नुपर्ने विवरण समयमै तयार गर्ने, गराउने ।
- केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइको आम्दानी, खर्चको आन्तारिक र अन्तिम लेखापरीक्षण समयभित्रै गराउने र अन्तर्गतका निकायहरूको लेखापरीक्षण भए नभएको अनुगमन गर्ने गराउने ।
- लेखापरीक्षणबाट प्राप्त कैफियत तथा बेरुजुहरूको फछ्यौट गर्ने, गराउने र बेरुजु लगत तथा अभिलेख अध्यावधिक गराउन लगाउने ।
- आफू अन्तर्गतको निकायहरूको म.ले.प बेरुजुको केन्द्रीय लगत अध्यावधिक गराई राख्ने र सम्परीक्षणको अभिलेख समेत राख्ने, राख्न लगाउने ।
- समष्टिगत रूपमा बक्यौता, बेरुजु फछ्यौट तथा बाँकीको विवरण एवं फछ्यौट सहितको तालिका तयार गर्न लगाई सम्बन्धित निकायमा पठाउने ।
- बेरुजु फछ्यौट तथा फरफारकको लागि अन्तर्गत निकायहरूलाई ताकेता गर्ने, गम्भिर बेरुजुहरूको सम्बन्धमा नियमानुसार कारबाही चलाउने
- मातहत निकायबाट बेरुजु नियमितका लागि पेश भइ सचिवबाट नियमित/स्वीकृत भएको बेरुजु सम्परीक्षणका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने ।
- असुल उपर गर्नुपर्ने ठहर भएको बेरुजुका सम्बन्धमा पर्याप्त कारबाही गर्दा पनि असुल उपर हुन नसकेमा स्पष्ट कारण खुलाई अन्तर्गत निकायबाट प्रचलित आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली अनुसार गर्ने/गराउने ।

- केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइबाट पेश भएको गत आर्थिक वर्षको राजश्व, धरौटी तथा विनियोजन बजेटको वार्षिक आर्थिक विवरण संकलन, विश्लेषण तथा एकीकृत गरी केन्द्रीय आर्थिक विवरण तयार गर्ने ।
- बजेटमा समावेश नभएका आर्थिक कारोबारहरूको विवरण लिने, कार्य सञ्चालन कोषको आर्थिक विवरण, प्राविधिक सहायता, विशेष खाताको आम्दानी खर्चको विवरण लिई एकीकृत गरी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पुर्याउने ।
- प्रचलित आर्थिक प्रशासन नियमावली अनुसार बैदेशिक ऋण, अनुदान (सोधभर्ना, अग्रिम नगद सहायता, सोझै भुक्तानी, वस्तुगत सहायताको हिसाब) तयार गरी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा पठाउनका लागि पेश गर्ने ।
- केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइबाट प्रचलित आर्थिक प्रशासन नियमावली बमोजिमको भुक्तानी दिन बाँकी रहेको केन्द्रीय आर्थिक विवरण समय भित्रै महालेखा परीक्षकको कार्यालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा पठाउनका लागि तयार गरी पेश गर्ने ।
- प्रचलित कानूनले तोकेको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धि अन्य कार्यहरू गर्ने, गराउने ।
- केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइको आर्थिक प्रशासनसँग सम्बन्धित विषयमा तोकेको अन्य कार्यहरू गर्ने, गराउने ।
- आफू मातहतका कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कानून बमोजिम गर्ने, गराउने
- आर्थिक मातहतका कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कानून बमोजिम गर्ने, गराउने ।
- बजेट अख्तियारी, थप निकाशा, रकमान्तर, श्रोतान्तर, बजेट रोक्का/फुकुवा, बजेट कार्यान्वयन आदि सम्बन्धमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय/अर्थ मन्त्रालयबाट भए/गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।
- केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइमा आर्थिक प्रशासनसँग सम्बन्धित विषयमा अनुगमन, निरीक्षण गरी गराई आर्थिक अनुशासन पालना गर्न लगाउने ।
- केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइबाट पेश हुन आएका आगामी आर्थिक वर्षको बजेट परिमार्जन गर्नुपर्ने भए गरी/गराई एकीकृत रूपमा बजेट तयार गर्ने ।
- शाखामा रहेका उपकरण लगायतका जिन्सी सामान, अभिलेख तथा कागजातहरूको सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउने ।

iii. कर्मचारी विवरण र जिम्मेवारी:

सि.नं.	पद	कर्मचारीको नाम	कार्य जिम्मेवारी	कैफियत
१	आयोजना निर्देशक	श्री लक्ष्मीप्रसाद भट्टराई	प्रमुख, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ	
२	आयोजना उप निर्देशक	श्री अशोक अधिकारी	विद्यालय पुनर्निर्माण शाखा	
३	प्रमुख लेखा नियन्त्रक	श्री भाष्कर शर्मा नेपाल	प्रमुख, आर्थिक प्रशासन शाखा	
४	उप सचिव	श्री जीवन बहादुर भण्डारी	प्रमुख, योजना तथा जनशक्ति व्यवस्थापन शाखा	

सि.नं.	पद	कर्मचारीको नाम	कार्य जिम्मेवारी	कैफियत
५	शाखा अधिकृत	श्री एकराज आचार्य	योजना तथा जनशक्ति व्यवस्थापन शाखा	
६	शाखा अधिकृत	श्री प्रेमप्रसाद त्रिपाठी	योजना तथा जनशक्ति व्यवस्थापन शाखा	
७	लेखा अधिकृत	श्री ठाकुर मणी दाहाल	आर्थिक प्रशासन शाखा	
८	इन्जिनियर	श्री पविन धिताल	विद्यालय पुनर्निर्माण शाखा	
९	इन्जिनियर	उमेश चौधरी	विद्यालय पुनर्निर्माण शाखा	
१०	इन्जिनियर	अर्जुन तामाङ्ग	विद्यालय पुनर्निर्माण शाखा	
११	इन्जिनियर	श्री विष्णु प्रसाद पौडेल	विद्यालय पुनर्निर्माण शाखा	अछाम
१२	इन्जिनियर	श्री सुरज पराजुली	विद्यालय पुनर्निर्माण शाखा	सुर्खेत
१३	इन्जिनियर	श्री तेज मानन्धर	विद्यालय पुनर्निर्माण शाखा	रुकुम पश्चिम
१४	इन्जिनियर	श्री रंजित कुमार सिंह	विद्यालय पुनर्निर्माण शाखा	बझाङ
१५	इन्जिनियर	श्री सुमन पोखरेल	विद्यालय पुनर्निर्माण शाखा	भक्तपुर
१६	नायब सुब्बा	श्री कृतनराज बराल	स्टोर	
१७	लेखापाल	श्री बोलकुमार स्याङ्तान	आर्थिक प्रशासन शाखा	
१८	प्राविधिक सहायक	श्री मधुसुदन रिजाल	योजना तथा जनशक्ति व्यवस्थापन शाखा	
१९	कम्प्युटर अपरेटर	श्री प्रतिष्ठा भट्टराई	पि. ए., आयोजना निर्देशक	
२०	कम्प्युटर अपरेटर	श्री रविराज हाकाजु	योजना तथा जनशक्ति व्यवस्थापन+आर्थिक प्रशासन शाखा	
२१	कम्प्युटर अपरेटर	श्री अर्जुन भुसाल	आर्थिक प्रशासन शाखा	
२२	कम्प्युटर अपरेटर	सुजता भट्टराई	योजना तथा जनशक्ति व्यवस्थापन शाखा/ स्टोर	
२३	ह.स.चा	श्री केदार तिमिल्सिना		
२४	ह.स.चा	श्री भोज थापामगर		
२५	ह.स.चा	श्री रामहरि थापामगर		
२६	ह.स.चा	श्री राजकुमार घलान		
२७	ह.स.चा	श्री अमित नगरकोटी		
२८	ह.स.चा	श्री राजेन्द्र क्षेत्री		
२९	का.स.	श्री भक्त कुमारी तामाङ		
३०	का.स.	श्री हेम माया जिरेल		
३१	का.स.	श्री कमल थापामगर		
३२	का.स.	श्री कल्पना रेग्मी		

विद्यालय पुर्निर्माण/निर्माण भैरहेको जिल्लामा खटिएका सब इन्जिनियरहरूको विवरण

क्र.सं.	जिल्ला	नाम	पद
१	बझाङ	ऋषिकेश धामी	सब-इन्जिनियर
२	रुकुम पश्चिम	शर्मिला गिरी	सब-इन्जिनियर
३	डोटी	नवीन कुमार दनुवार	सब-इन्जिनियर
४	जुम्ला	राज बहादुर बुढा	सब-इन्जिनियर
५	कालिकोट	विकास कुमार शाह	सब-इन्जिनियर
६	अछाम	लक्ष्मण ताजपुरिया	सब-इन्जिनियर
७	जाजरकोट	राम यादव	सब-इन्जिनियर
८	बैतडी	रविन्द्र कुमार यादव	सब-इन्जिनियर
९	डडेलधुरा	हेमलता पन्त	सब-इन्जिनियर
१०	दार्चुला	गणेश कुमार शर्मा	सब-इन्जिनियर
११	सल्यान	मकेश्वर शाह	सब-इन्जिनियर
१२	सुर्खेत	कुशेश्वर यादव	सब-इन्जिनियर
१३	दैलेख	देवेन्द्र सिवाकोटी	सब-इन्जिनियर
१४	डोल्पा	पूर्ण बहादुर बि.के.	सब-इन्जिनियर
१५	बाजुरा	रुद्र तिरुवा	सब-इन्जिनियर

६. प्रदान गरिने मुख्य सेवा:

- भौतिक पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने विद्यालयहरूको ड्रइङ, डिजाइन तयारी सम्बन्धी कार्य ।
- वि.स.२०७२ को भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सामुदायिक विद्यालयहरूको दाताहरूसँगको सम्झौता अनुसारको बाँकी पुनर्निर्माण कार्य ।
- नेपाल सरकार तथा दाताहरूको सहयोगमा वि.स.२०८० को जाजरकोट तथा बझाङ भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सामुदायिक विद्यालयको पूर्णनिर्माण कार्य ।
- २००० भन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयहरूको छनोट, ड्रइङ, डिजाइन तयारी र पूर्वाधार निर्माणको कार्य ।

७. सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर: स्वीकृत लागत अनुमानको आधारमा वोल्पत्र खरिदका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसारको तोकिएको रकम। कार्यालयको सूचनाका सम्बन्धमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ७ ले तोकेको दस्तुर र अवधि भित्र र अन्यका हकमा नागरिक बडापत्रमा तोके बमोजिम हुने ।

८. निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी: कामको प्रकृति र शाखाको कार्यविवरण अनुसार जिम्मेवारी तोकिएको अधिकारीबाट कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने र कार्यालयबाट टुङ्गिने विषयको हकमा परियोजना निर्देशकबाट अन्तिम निर्णय हुने र थप निर्णय गर्नुपर्नेको हकमा मन्त्रालयमा पेश हुने ।

९. निर्णय उपर गुनासो सुन्ने अधिकारी: श्री लक्ष्मीप्रसाद भट्टराई, आयोजना निर्देशक

१०. चालु आ.व.मा सम्पादन गरेका मुख्य मुख्य कार्यहरु एवं प्रगति

क. आव २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण

चालु तथा पुँजीगत बजेटको भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिको सारांश

बजेट रु लाखमा

क्र सं	बजेट उपशिर्षक नं.	बजेट को प्रकार	वार्षिक बजेट	तेस्रो त्रैमासिक अवधिको		तेस्रो त्रैमासिकमा भएको प्रगति प्रतिशत		चालु आ.व. को चैत्र मसान्तसम्मको		चालु आ.व. को चैत्र मसान्तसम्मको प्रगति प्रतिशत	
				बजेट	खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	बजेट	खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
	३५०००११	चालु	६४६	१२१	११२.०	९२	९०	५००	३२०	६४.००	७२.२
१		पुँजीगत	४४१३६	१२८०६	५४८५	४३	५०	३६४७९	११७४५	३२.२०	५५
२		जम्मा	४४७८२	१२९२७	५५९७	४३.२९		३६९७९	१२०६५	३२.६३	

ख. आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमासिक अवधिमा हासिल भएका निकायगत मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु

- ADB को ऋण सहयोगमा जाजरकोट र रूकुम पश्चिममा गरि २९ वटा विद्यालय पुनर्निर्माण भैरहेको ।
- JICA को ऋण सहयोगमा जाजरकोट जिल्लामा ११ वटा विद्यालय पुनर्निर्माण भैरहेको ।
- जिपिईको अनुदान सहयोगमा बझाङ जिल्लामा ९ वटा पक्की तथा ६४ वटा अर्ध पक्की विद्यालय पुनर्निर्माण भैरहेको ।
- पश्चिम नेपाल भूकम्प प्रभावित १५ जिल्लाका १३४ कक्षाकोठा निर्माणको लागि विद्यालय व्यवस्थापन समिति मार्फत सम्झौता गरी तथा निर्माण कार्य शुरू गरिएको ।
- विभिन्न समयमा भएको प्राकृतिक विपद्को कारणले क्षति पुगेका ८२ वटा विद्यालय पुनर्निर्माण निर्माणको लागि विद्यालय छनोट, लागत अनुमान तयारी गरी निर्माण सम्झौता तथा निर्माण कार्य शुरू गरिएको ।
- २०७२ को भूकम्पले क्षति पुर्‍याएर पुनर्निर्माण कार्य गरिएका विद्यालय मध्ये २५ वटा विद्यालयको नियमित मर्मत कार्यको लागि विद्यालय छनोट, लागत अनुमान तयारी गरी निर्माण सम्झौता तथा निर्माण कार्य शुरू गरिएको ।
- एडिबी र जाइकाको ऋण सहयोगमा निर्माण भएका विद्यालयको Supervision Consultant मार्फत नियमित सुपरीवेक्षण र प्रतिवेदनको कार्य भैरहेको ।

- भारतीय सरकारको अनुदान सहयोगमा थप १४ वटा विद्यालय पुनर्निर्माणको लागि बोलत्र सूचनाको आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गरी विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायी अवार्ड गर्ने क्रममा रहेको ।
- २०७२ को भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका विद्यालय अन्तर्गत बाँकी निर्माण कार्य भैरहेको ।
- दुई हजार भन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयहरू मध्ये २७ वटा निर्माण भैरहेको । थप १८ वटा निर्माणको क्रममा रहेको साथै ४४ वटाको लागत अनुमान तयार भैरहेको ।
- कर्णाली तथा सुदुर पश्चिम प्रदेशका विभिन्न १७ जिल्लामा कार्यरत इकाइ प्रमुख, इन्जिनियर, सब इन्जिनियर लगायतलाई विद्यालय पुनर्निर्माणको हालसम्मको कार्य प्रगति एवं राष्ट्रिय भवन संहिताको विषयमा अभिमुखीकरण आयोजना गरिएको ।
- आगामी आ व २०८३/८४ को कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा छलफल सम्पन्न ।
- विद्यालय पुनर्निर्माण कार्यका सम्बन्धमा सम्बन्धित विकास साझेदारसँग समन्वय एवं छलफल भैरहेको ।

११. सूचना अधिकारीको नाम र पद: जीवन बहादुर भण्डारी, उपसचिव (शिक्षा)

१२. निर्मित कार्यविधि, निर्देशिका मापदण्ड:

- विद्यालय पुनर्निर्माण कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२
- दुई हजार भन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८२
- प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षति पुगेका विद्यालयको पुनर्निर्माण तथा मर्मत सम्भार सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२
- कन्टिन्जेन्सी रकम खर्च गर्ने कार्यविधि, २०८२

१३. बजेट र खर्चको अद्यावधिक विवरण:

चालु आ.व. २०८२/८३ मा चालु तर्फ रु ६ करोड ४६ लाख र पूँजिगत तर्फ रु ४ अर्ब ४१ करोड ३६ लाख गरी जम्मा रु ४ अर्ब ४७ करोड ८२ लाख बजेट विनियोजन स्वीकृत भएकोमा चालु आ.व.को चैत्र मसान्त सम्म चालु तर्फ रु ३ करोड २० लाख र पूँजिगत तर्फ रु १ अर्ब १७ करोड ४५ लाख जम्मा रु १ अर्ब २० करोड ६५ लाख खर्च भएको छ ।

१४. सूचनाको लागि: कार्यालयको वेब साइट www.moepiu.gov.np र बोलपत्र सम्बन्धी सूचनाको लागि: bolpatra.gov.np

१५. सूचना प्रकाशन भएको विवरण: निर्माण सम्बन्धि कार्यको लागि बोलपत्रको सूचना प्रकाशन

१६. सूचना माग सम्बन्धी विवरण: विवरण प्राप्त नभएको

१७. सूचना माग र प्रवाहको अभिलेख:

क्रस	सूचना माग गरेको व्यक्तिको नाम थर र ठेगाना	माग भएको सूचनाको विवरण	सूचना दिएको मिति	सूचना उपलब्ध गराएको तह (कार्यालय प्रमुख वा सूचना अधिकारी)	सूचना नदिएको भएमा सोको कारण	सूचना प्रदान गरिएको तरिका	कैफियत
							सूचना माग नभएको
